



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

INTERVENTO: POR FESR 2014-2020 – Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 – Intervento “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – Fase 2”. REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DI NURACHI - CUP: E74E19000000002 CIG. Z6D2C9D0CA

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione	Comune di Nurachi
Servizio responsabile	Ufficio Tecnico
Indirizzo	Piazza Chiesa n. 12
C.A.P.	09070
Località/Città	Nurachi
Provincia	Oristano
Telefono	0783 - 412085
Telefax	0783 - 412086
Posta elettronica (e-mail)	utnurachi@tiscali.it
PEC	comunedinurachi@pec.it
Indirizzo Internet (URL)	www.comune.nurachi.or.it

LE PREMESSE.

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 34/15 del 03.07.2018, ha approvato lo schema di Avviso pubblico relativo al POR FESR 2014-2020 – Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 – Intervento “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – Fase 2” che individua le somme destinate al finanziamento delle amministrazioni comunali della Sardegna.

La Ras – Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione con determinazione n° 411/2019 ha tra l’altro stabilito di:

- approvare l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2;
- indire la procedura per la presentazione delle domande di contributo relativa all’intervento “*Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2*”, da attuarsi a regia regionale e secondo l’iter procedurale stabilito dalla Giunta Regionale con Delibera n. 34/15 del 3/07/2018 e secondo le modalità dettagliate nell’Avviso pubblico;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

Il Comune di Nurachi, partecipante al bando di cui sopra, è risultato beneficiario di un finanziamento di € 45.000,00 da parte della Regione Autonoma della Sardegna Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regionale per la realizzazione di una rete di videosorveglianza urbana a valere sull'intervento denominato *"Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2"*;

Con la convenzione attuativa del finanziamento, stipulata il 01/10/2018 tra l'Amministrazione Comunale di Nurachi e la Regione Autonoma della Sardegna, sono disciplinati gli impegni reciproci assunti dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal beneficiario ai fini del finanziamento dell'intervento in epigrafe;

IL PROGETTO

Il progetto è stato concepito in base all'esigenza di monitorare l'area esterna di alcuni edifici pubblici e di tenere sotto controllo il passaggio dei veicoli in ingresso e in uscita dal centro urbano, lungo la S.S. 292, il tutto conformemente a quanto riportato nella Direttiva Ministeriale degli Interni sui sistemi di videosorveglianza in ambito Comunale n. 558 del 10/03/2012.

Riuscendo a sfruttare la rete wireless pubblica esistente, si è programmato di installare un impianto di videosorveglianza, costituito da otto telecamere di contesto, dislocate presso quattro edifici Comunali e due telecamere di lettura targhe veicoli lungo il Corso Eleonora (VED. TAVV di progetto), tutte in grado di garantire efficienti riprese sia durante le ore diurne e sia durante le ore notturne.

A tale scopo è stato individuato un professionista a cui affidare i servizi tecnici riguardanti il servizio di progettazione in fase preliminare, definitiva esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo dei lavori denominati *"Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio di Nurachi"*.

L'incarico di progettazione è stato affidato con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 54 in data 08.04.2019 all'Ing. Giambenedetto Sardu con studio in via Tharros, 8 – 09070 – Nurachi (OR) – CF SRDGBN70T12F980X P.IVA 01042460954.

L'iter autorizzativo del progetto si è sviluppato nei seguenti passi:

- il progetto preliminare è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 67 in data 01.08.2019;
- il progetto definitivo è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 74 in data 24.09.2019;
- la Prefettura di Oristano, con la nota in data 04.02.2020, acclarata al protocollo comunale in data 06.02.2020 al n° 863, ha espresso parere favorevole al progetto, come risulta dal verbale della riunione tenutasi in data 24.01.2020;
- l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota prot. n° 1354 del 28.02.2020, ha inviato il parere nel quale si segnala che la documentazione trasmessa non dà atto di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n° 2 dell'AdG Linee guida per le azioni di informazione di comunicazione (Allegato n° 3 dell'Avviso Pubblico) e propone un'azione;
- il Servizio tecnico comunale ha incaricato il progettista di apportare le modifiche progettuali richieste dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione necessarie per poter procedere con l'ultima fase progettuale prioritaria per appaltare i lavori in oggetto nel rispetto delle tempistiche stabilite nel crono programma dei lavori;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

- l'ing. Giambenedetto Sardu, con la nota in data 09.03.2020, acclarata al protocollo comunale in data 11.03.2020 al n° 1752, ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali integrati e modificati secondo le prescrizioni dettate dall'Assessorato regionale. Il quadro economico di progetto, che prevede una spesa complessiva di € 45.000,00, non ha subito alcuna modifica rispetto a quello già approvato con deliberazione della G.M. n° 74/2019, nonostante siano stati inseriti alcuni interventi richiesti dall'Assessorato regionale inerenti le regole d'informazione e comunicazione a carico del beneficiario del finanziamento;
- il progetto definitivo è stato riapprovato con la deliberazione della G.M. n° 18 in data 20.03.2020;
- il progetto esecutivo dei lavori che prevede una spesa complessiva di € 45.000,00, è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 17 in data 12.03.2020. Alla spesa complessiva di € 45.000,00 si farà fronte con i fondi del bilancio comunale iscritti nel bilancio al capitolo 9466 RR.PP. 2019;

QUADRO ECONOMICO

a1) Importo lavori a base d'asta	€	28.000,00
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
A) Importo complessivo dei lavori	€	28.500,00
b1) Spese tecniche relative alla progettazione e alla direzione lavori e contabilità, compreso C.I (4%) ed IVA (22%)	€	8.655,36
b2) Imprevisti	€	843,84
b3) IVA sui lavori 22%	€	6.270,00
b4) Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (1,28%)	€	364,80
b5) Spese per rilievi e indagini	€	366,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€	16.500,00
C) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	45.000,00

Ai fini dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

Lavorazioni	Categ.	Classe	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	Avvalimento
Impianti tecnologici	OG11	I	€ 28.500,00	100	Prevalente Subappaltabili entro i limiti di cui all'art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16	SI




Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

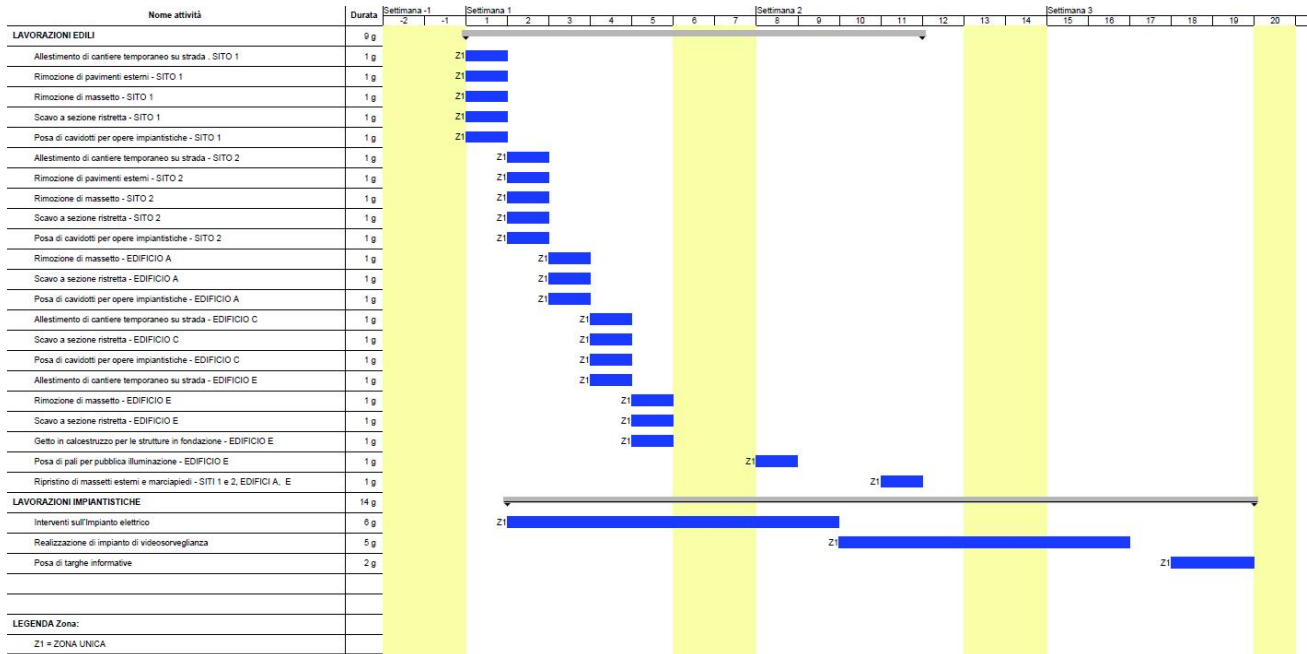

LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Al fine di individuare un idoneo operatore economico con determinazione n. 41 del 03.04.2020 è stata esperita una procedura di selezione del contraente cui affidare l'appalto in oggetto, ed essendo l'importo inferiore a € 40.000,00, è stato utilizzato la procedura di affidamento diretto conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all'articolo 36, comma 2, lett. a), alle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" redatta in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016, previa acquisizione di un preventivo di spesa tramite consultazione di più operatori economici.

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO rivolta agli operatori economici al momento della pubblicazione della presente RdO iscritti ed abilitati all'interno delle seguenti categorie merceologiche:

- AQ22AN OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI
 - ↳ AQ22AN22 Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

Al fine di determinare il prezzo più conveniente per l'Amministrazione, si è provveduto a richiedere agli operatori economici individuati, in possesso dei requisiti elencati in premessa, e iscritti alle categorie



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

merceologiche sopra elencate nella piattaforma CAT Sardegna un preventivo di spesa per i lavori in oggetto, mediante richiesta di offerta a (RDO) sul mercato elettronico Sardegna CAT;

L'invito è stato pubblicato in giorno 03.04.2020 sul portale telematico Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - <https://www.sardegncat.it> - Servizi per le Imprese Bandi di gara - RdO: rfq_353062 Tender_208679. Con l'invito sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione ed è stato fissato al giorno 21.04.2020 ore 9.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col relativo corredo documentale.

L'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato con determinazione n. 44 del 21.04.2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, all'operatore economico Label Sistemi Tecnologici di Fanari Maurizio, con sede a Oristano in via Gramsci 13 C.F. FNRMZG69D03G113X, P.IVA 01058870955, per l'importo di € 25.592,00, derivante dal ribasso del 8,6% (otto virgola sei per cento) sull'importo posto a base di affidamento (pari ad € 28.000,00), oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari a € 26.092,00 oltre l'IVA in misura di legge, per complessivi € 31.832,24.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico, approvato con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 109 in data 21.08.2020, si è modificato come segue:

A		IMPORTO LAVORI	
a1	Importo lavori a base d'asta	€	28.000,00
a2	Ribasso d'asta	-8,60%	€ -2.408,00
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00
Totale Importo dei lavori		€	26.092,00
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1	I.V.A. sui lavori	22%	€ 5.740,24
b2	Spese tecniche		€ 6.821,69
b3	Contributo integrativo	4%	€ 272,87
b4	I.V.A. per spese tecniche	22%	€ 1.560,80
b5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 364,80
b6	Attività di sondaggio opere esistenti		€ 0,00
b7	Imprevisti		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	14.760,40
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	40.852,40
Economie di gara			
	Ribasso d'asta	€	2.408,00
	Per minore IVA	€	529,76
	Attività di sondaggio opere esistenti	€	366,00
	Imprevisti e arrotondamenti	€	843,84
totale economie di gara		€	4.147,60
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	45.000,00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

In data 18.05.2020 il direttore dei lavori Ing. Giambenedetto Sardu ha proceduto alla consegna degli stessi, come si evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

termine di 21 (ventuno) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07.06.2020.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 29.05.2020 e ripresi in data 27.07.2020 (per 58 giorni), con un differimento del termine di ultimazione lavori al giorno 10.08.2020.

PERIZIE SUPPLETIVE:

Durante il corso dei lavori, il direttore dei lavori Ing. Giambenedetto Sardu, ha segnalato la necessità di dover procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, per recepire alcune modifiche non sostanziali, secondo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e nel rispetto delle limitazioni del comma 2 dello stesso articolo (importo di variante inferiore alla soglia comunitaria e al 15% dell'importo contrattuale).

Il Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Mastinu con nota prot. n. 4192 del 04.06.2020 comunicava quanto segue:

- ha autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 106 D.Lgs. n° 50/2016 la redazione della variante non sostanziale;
- la perizia dovrà eventualmente tener conto dell'aggiornamento dei costi della sicurezza necessari per far fronte alla pandemia da Covid-19;
- le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta e da somme a disposizione ammontano a complessivi € 4.147,60;

La perizia di variante è stata approvata con deliberazione della G.M. n° 50 in data 22.07.2020, e ammonta a complessivi € 45.000,00, come rideterminato nel seguente quadro economico:

A		IMPORTO LAVORI	
a1	Importo lavori a base d'asta	€	30.829,58
a2	Ribasso d'asta	€	-2.651,34
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	570,00
Totale Importo dei lavori		€	28.748,24
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1	I.V.A. sui lavori	22% €	6.324,61
b2	Spese tecniche	€	7.507,28
b3	Contributo integrativo	4% €	300,29
b4	I.V.A. per spese tecniche	22% €	1.717,67
b5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	401,91
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	16.251,76
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	45.000,00



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

Per effetto dell'inserimento dei nuovi lavori previsti in perizia e per la realizzazione di maggiori quantità di lavori rispetto al progetto approvato, risulta un quadro di raffronto tra il quadro economico di progetto e quello di variante di seguito illustrato:

			PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZE
A					
IMPORTO LAVORI					
a1	Importo lavori a base d'asta	€	28.000,00	30.829,58	2.829,58
a2	Ribasso d'asta	-8,60% €	-2.408,00	-2.651,34	-243,34
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	500,00	570,00	70,00
Totale Importo dei lavori		€	26.092,00	28.748,24	2.656,24
B					
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
b1	I.V.A. sui lavori	22% €	5.740,24	6.324,61	584,37
b2	Spese tecniche	€	6.821,69	7.507,28	685,59
b3	Contributo integrativo	4% €	272,87	300,29	27,42
b4	I.V.A. per spese tecniche	22% €	1.560,80	1.717,67	156,87
b5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	364,80	401,91	37,11
b6	Attività di sondaggio opere esistenti	€	0,00	0,00	0,00
b7	Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	14.760,40	16.251,76	1.491,36
Economie di gara					
	Ribasso d'asta	€	2.408,00		
	Per minore IVA	€	529,76		
	Imprevisti e arrotondamenti	€	843,84		
	Attività di sondaggio opere esistenti	€	366,00		
	totale economie di gara	€	4.147,60		
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	45.000,00	45.000,00	4.147,60

Con deliberazione della G.M. n° 37 in data 11.06.2020 si è tra l'altro stabilito di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Demelas, che ammonta a complessivi € 70.000,00, come rideterminato nel seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori				
A.1	Importo lavori a base d'asta	€	56.734,16	
A.2	Ribasso d'asta	10,00% €	5.673,42	
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.507,72	
IMPORTO CONTRATTUALE			€	53.568,46
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.7.1	Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo	€	8.107,18	
B.7.2	Contributo integrativo	4% €	324,29	
B.8.1	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016	1,28% €	758,30	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	30,00	



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

B.12.1	I.V.A. per spese tecniche	22%	€	1.854,92
B.12.2	I.V.A. per lavori	10%	€	5.356,85
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	16.431,54

TOTALE COSTO INTERVENTO € 70.000,00

Per effetto dell'inserimento dei nuovi lavori previsti in perizia e per la realizzazione di maggiori quantità di lavori rispetto al progetto approvato, risulta un quadro di raffronto tra il quadro economico di progetto e quello di variante di seguito illustrato:

			PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZE
A. Importo dei Lavori					
A.1	Importo lavori a base d'asta	€	53.025,73	56.734,16	3.708,43
A.2	Ribasso d'asta	10,00%	€ 5.302,57	5.673,42	
A.3	Importo netto dei lavori	€	47.723,16	51.060,74	3.337,58
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	917,10	2.507,72	1.590,62
IMPORTO CONTRATTUALE		€	48.640,26	53.568,46	4.928,20
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.7.1	Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo	€	7.391,92	8.107,18	715,26
B.7.2	Contributo integrativo	4%	€ 295,68	324,29	28,61
B.8.1	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016	1,28%	€ 690,47	758,30	67,83
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	30,00	30,00	0,00
B.12.1	I.V.A. per spese tecniche	22%	€ 1.691,27	1.854,92	163,65
B.12.2	I.V.A. per lavori	10%	€ 4.864,03	5.356,85	492,82
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	14.963,37	16.431,54	1.468,17
Economie di gara					
	Ribasso d'asta	€	5.302,57		
	Per minore IVA	€	530,25		
	Imprevisti e arrotondamenti		563,55		
totale economie di gara		€	6.396,37		
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	70.000,00	70.000,00	0,00

Dal confronto tra i due quadri economici, si desume che per effetto della presente perizia:

- l'importo netto dei lavori aumenta di € 2.829,58: da € 28.000,00 a € 30.829,58;
- gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso aumentano di € 70,00: da € 500,00 a € 570,00;
- l'importo contrattuale aumenta complessivamente di € 2.656,24: da € 26.092,00 a € 28.748,24;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

- le somme a disposizione dell'amministrazione aumentano complessivamente di € 1.491,36: da € 14.760,40 a € 16.251,76 a seguito dei maggiori oneri determinati per le spese tecniche per la redazione della perizia di variante, degli oneri per le funzioni tecniche e per l'aumento dell'IVA sulle spese tecniche e per i maggiori lavori;

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta alcuna proroga.

STATI AVANZAMENTO LAVORI.

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 1 stati di avanzamento regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento, che di seguito si elencano:

- SAL n. 1 in data 06/07/2020 di euro 24.465,59;

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

A seguito dell'emissione dei SAL sono stati predisposti i seguenti certificati di pagamento:

- n. 1 in data 06/07/2020 di euro 22.200,00;

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto.

Le stesse sono state eseguite regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 06.08.2020 nel rispetto del tempo utile previsto.

STATO FINALE DEI LAVORI

In data 06.08.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 06.08.2020, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 30.829,58 oltre ad € 570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

La contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto, predisposti dal direttore dei lavori, sono stati approvati con la determinazione n. 109 in data 21.08.2020.

Dagli atti di contabilità si rileva che l'operatore economico affidatario ha eseguito opere per complessivi € 28.178,24 (al netto di ribasso d'asta), oltre ad € 570,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 28.178,24+570,00=€ 28.748,24, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 22.200,00, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 6.548,24, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 7.988,85.

II DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 18.05.2020 il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione dei contratti con il quale sono state individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Mastinu
