



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

INTERVENTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI NURACHI E RIOLA SARDO. CUP: E77H18000920002 CIG: 8017949CD1

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione	Comune di Nurachi
Servizio responsabile	Ufficio Tecnico
Indirizzo	Piazza Chiesa n. 12
C.A.P.	09070
Località/Città	Nurachi
Provincia	Oristano
Telefono	0783 - 412085
Telefax	0783 - 412086
Posta elettronica (e-mail)	utnurachi@tiscali.it
PEC	comunedinurachi@pec.it
Indirizzo Internet (URL)	www.comune.nurachi.or.it

LE PREMESSE.

I Comuni di Nurachi e di Riola Sardo hanno partecipato al bando 2017 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" approvato con la determinazione della R.A.S. – Assessorato all'Agricoltura - Direzione Generale - Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture 15347/461 del 07.08.2017, sotto forma di associazione temporanea tra gli stessi secondo la forma della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, demandando il ruolo di capofila al Comune di Nurachi;

Lo schema di convenzione tra i Comuni di Nurachi e Riola Sardo per la partecipazione in forma associata al Bando suddetto è stato approvato con deliberazione della G.M. n° 24 in data 31.08.2017.

l'Agenzia Regionale ARGEA con determinazione n° 2395 in data 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie ha approvato la graduatoria unica regionale relativa la sottomisura 4.3.1 dalla quale si evince che il comune di Nurachi è risultato beneficiario del finanziamento di € 400.000,00 per gli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale.

IL PROGETTO

Le opere relative all'intervento in oggetto consistono nella manutenzione straordinaria di due strade nell'ambito della viabilità rurale del territorio del Comune di Nurachi e Riola Sardo, al fine di migliorare le



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

caratteristiche della sovrastruttura ed agevolare l'accessibilità ai terreni interessati senza modificare le caratteristiche geometriche del tracciato, ovvero della sezione trasversale e dell'andamento plano-altimetrico. Il passare del tempo ed il passaggio continuo di mezzi meccanici e l'agire degli agenti atmosferici ha dato luogo sistematicamente alla scomparsa del pietrisco e alla formazione di buche sulla sede stradale, con la conseguente presenza di pozzanghere, nonché alla crescita eccessiva dei cespugli, delle siepi situati ai bordi delle strade e dell'erba che talvolta va ad ostruire le cunette laterali. Allo stesso modo il passaggio continuo di mezzi agricoli verso le aziende ha logorato lo strato sottostante a causa della perdita nel tempo del materiale inerte presente superficialmente e alla conseguente formazione di buche nelle parti meno resistenti, con la successiva formazione di pozzanghere durante i periodi delle piogge. Il verificarsi delle piogge durante i periodi invernali ha dato luogo alla crescita di erbacee lungo le cunette laterali di smaltimento causandone l'ostruzione con il conseguente allagamento della sede stradale.

Pertanto, l'amministrazione comunale di Nurachi ha dato l'incarico di redigere un progetto che mirasse alla messa in sicurezza della viabilità ai fini di una migliore fruibilità e percorribilità da parte di persone e mezzi da attuarsi mediante bitumatura di alcune delle arterie principali della viabilità rurale di Nurachi.

L'incarico di progettazione è stato affidato all'Ing. Giordano Fadda, con studio a San Gavino Monreale (VS), con determinazione n. 100 del 23.07.2018.

Il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall'Ing. Giordano Fadda, è stato approvato con la deliberazione della G.M. n° 112 in data 29.11.2018 e prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 a cui si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio corrente al capitolo 12355, derivanti da:

- Intervento complessivo: € 400.000,00;
- ↳ Finanziamento ARGEA: € 371.269,33;
- ↳ Cofinanziamento comunale: € 28.730,67;
- ↳ Quota Comune Nurachi: € 14.365,34;
- ↳ Quota Comune Riola Sardo: € 14.365,33;

QUADRO ECONOMICO

a1) Importo lavori a base d'asta	€	313.527,99
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.196,66
A) Importo complessivo dei lavori	€	314.724,65
b1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%)	€	10.778,52
b2) Imprevisti	€	1.003,93
b3) IVA sui lavori 22%	€	69.239,42
b4) Contribuzione ANAC	€	225,00
b5) Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (1,28%)	€	4.028,48



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)


B) Somme a disposizione dell'amministrazione € 85.275,35

C) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400.000,00

Ai fini dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

Lavorazioni	Categ.	Classe	Qual.	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	Avval.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	II	Obbligatoria	€ 314.724,65	100	Prevalente Subappaltabili entro i limiti di cui all'art. 105 c. 2, D.Lgs. 50/16	SI

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

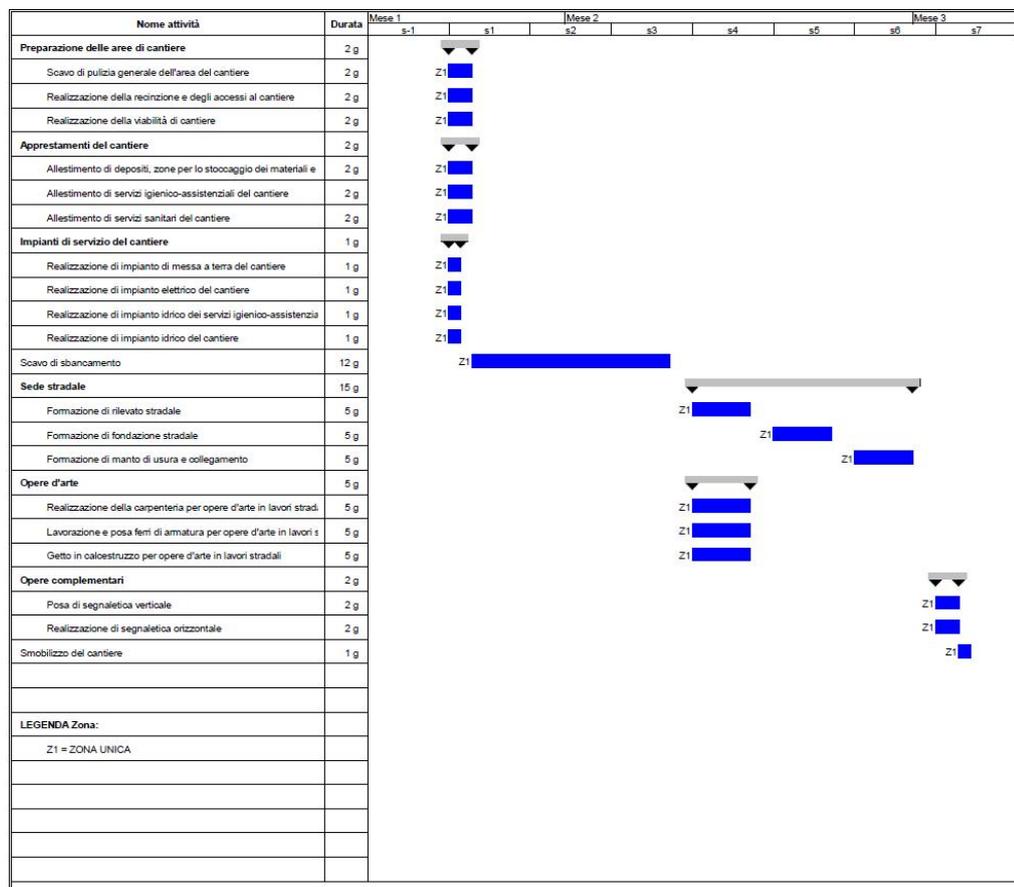

LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

Al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l'appalto in oggetto è stata esperita una gara d'appalto sotto soglia comunitaria mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a misura, ai sensi dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2007.

La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione della RDO rfq_342322 tender_208679 rivolta all'operatore economico in indirizzo, iscritto ed abilitato all'interno della categoria merceologica:

- AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
- ↳ AQ22AC24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)

Il Bando di Gara è stato pubblicato su nella piattaforma digitale Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT.

Con il Bando di Gara / Disciplinare:

- sono state definite le modalità di partecipazione, la procedura e il criterio di aggiudicazione;
- era stato fissato al giorno 20/09/2019 ore 09.00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte col relativo corredo documentale;
- era stato fissato al giorno 20/09/2019 ore 9.00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune, l'apertura in seduta pubblica delle buste elettroniche;

In esito alla procedura di cui all'oggetto, svoltasi in seduta unica ed esperita tramite il portale telematico Sardegna CAT il giorno 20.09.2019, sulla base delle risultanze riportate nel report generato dal sistema, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, è risultato aggiudicatario dell'appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto dalla normativa vigente, l'operatore economico IK COSTRUZIONI srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc. sa mitza SP12 km 3,150 P.IVA 03531210924, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso d'asta del 28,298% (ventottovirgoladuecentonovantottopercento) sull'importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che fissa l'importo di € 224.805,84 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 226.002,50, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 275.723,05.

Con la determinazione n. 149 del 23.09.2019 si è stabilito tra l'altro di approvare il verbale di gara svoltasi in seduta unica in data 20.09.2019, come risulta nello stesso verbale allegato alla determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche come previsto dalla normativa vigente, è l'operatore economico IK COSTRUZIONI srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in loc. sa mitza SP12 km 3,150 P.IVA 03531210924, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso d'asta del 28,298% (ventottovirgoladuecentonovantottopercento) sull'importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che fissa l'importo di € 224.805,84 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 226.002,50, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 275.723,05.

A seguito di ulteriori verifiche effettuate sulle dichiarazioni dell'operatore economico aggiudicatario, si è constatato che ha riportato in sede d'offerta un costo della manodopera inferiore a quello indicato nei documenti di gara, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai costi della manodopera e al fine della verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Pertanto con nota prot. 6823 del 25.09.2019 si è provveduto a richiedere all'operatore economico IK COSTRUZIONI srl idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione di tale costo.

L'operatore economico IK COSTRUZIONI srl ha trasmesso con nota prot. 7244 del 10.10.2019 le spiegazioni relative ai costi della manodopera indicati in sede di offerta e con nota prot. 7566 del 24.10.2019 la relazione integrativa, corredata da allegato contenente le analisi delle voci rappresentative;

Si rileva altresì che con nota prot. 6979 del 01.10.2019 l'operatore economico Conglomerati Bituminosi srl con sede a Simaxis (OR) in breve segnalava che: << l'art. 97 comma 2 bis de! d. Lgs. 50/2016 (a differenza di quanto prevedeva il testo originario dell'art. 97) non comporta la necessità di escludere le offerte che si collocano alle ali, ma solo quella di accantonarle ai soli fini della determinazione delle medie ... omissis ... Il testo vigente dell'art. 97 in questione consente dunque che una ditta "accantonata" al fine dell'individuazione della media possa essere anche aggiudicataria, se la sua offerta risulta la prima classificata in applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso art. 97 comma 2bis. In sostanza, l'accantonamento delle ali ai fini della media ha il solo fine di rendere non predeterminabili i ribassi ... omissis ... ma non di escludere automaticamente ditte che non risultino anomale a seguito del conteggio >>;

La Stazione Appaltante, al fine di stabilire se a nel determinare la graduatoria provvisoria degli operatori economici ha agito correttamente, provvedendo ad escludere gli operatori economici le cui offerte si collocano alle ali, con nota in data 03.10.2019 ha inviato una richiesta di parere all'ANAC nell'esercizio della sua funzione consultiva, esplicitando il seguente quesito: << Voglia chiarire l'ANAC se l'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 imponga sempre l'esclusione delle offerte che si collocano alle ali (impedendo che esse divengano aggiudicatarie, anche se non sono anomale) o se invece tali offerte debbano essere accantonate esclusivamente al fine d'individuare la soglia d'anomalia, ma siano da considerare ammesse alla gara a tutti gli effetti con possibilità, quindi, d'ottenere l'aggiudicazione >>.

L'ANAC con nota prot. 6979 del 01.10.2019 comunicava tra l'altro quanto segue: << In esito a quanto richiesto con nota della s.a. acquisita al prot. n. 78416 del 7 ottobre 2019, e successiva nota dell'o.e. acquisita al prot. n. 81498 del 16 ottobre 2019. si rappresenta, in , via preliminare, che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale. Con riferimento al quesito formulato, relativo alla procedura di gara indicata in oggetto ed alle modalità con le quali procedere ai calcoli previsti dall'art. 97, comma 2-bis del Codice ai fini della determinazione della congruità delle offerte, si comunica di seguito quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 13.11.2019. Per quanto di competenza di questa Autorità, si rinvia alle considerazioni svolte, in particolare, nella delibera n. 793 del 19 luglio 2017, prec 109/17/L, a tenore della quale «per costante orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa le offerte temporaneamente accantonate con il taglio delle ali sono escluse sia dal calcolo della media aritmetica dei ribassi sia dal successivo calcolo dello scarto medio dei ribassi» (v. Determinazione n. 6/2009, Parere di precontenzioso n. 133/2013, CdS, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953 e sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818). Inoltre, in relazione «(...) alla questione della sorte che tocca alle offerte che cadono nel taglio delle ali ovvero se siano



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

automaticamente escluse o accantonate temporaneamente ai fini del calcolo della soglia di anomalia ... appare ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali offerte sono escluse solo fittiziamente e limitatamente alla fase di calcolo della soglia di anomalia, come del resto più ampiamente argomentato nella citata Delibera n. 603/17» (prec. 109/17/L, cit.) >>.

La Stazione Appaltante pertanto con determinazione n. 191 del 23.09.2019 ha stabilito tra l'altro:

- di dover seguire l'interpretazione resa dall'ANAC in merito al taglio delle ali e pertanto ritenuto necessario rettificare la graduatoria di gara approvata con determinazione n. 149 del 23.09.2019, con l'inserimento nella graduatoria finale degli operatori economici inizialmente esclusi automaticamente ai fini del calcolo della soglia dell'anomalia, perché compresi all'interno delle ali, così come di seguito riportata:

CLASS.	IMPRESA	OFFERTE	esito
	3M SRL	32,2550	ANOMALA
1	CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	28,7830	AMMESSO
2	ik costruzioni srl	28,2980	AMMESSO
3	OCRAM COSTRUZIONI	26,8460	AMMESSO
4	VIATECH COSTRUZIONI GENERALI	26,6690	AMMESSO
5	Impresa Enrico Congiu	26,5110	AMMESSO
6	ECOTEKNA SRL	25,8970	AMMESSO
7	SO.GE.LA. S.r.l. "SOCIETA' GESTIONE LAVORI"	25,8800	AMMESSO
8	IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRU'	25,6490	AMMESSO
9	FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."	24,8270	AMMESSO
10	AGI COSTRUZIONI SRL	20,2500	AMMESSO
11	PEDDIO COSTRUZIONI SRL	19,0950	AMMESSO

- di revocare l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'operatore economico iK Costruzioni srl, disposta con la propria determinazione n. 149 del 23.09.2019;
- di aggiudicare in via provvisoria la gara dei lavori in oggetto all'operatore economico Conglomerati Bituminosi srl con sede a Simaxis (OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, la cui offerta è la prima al di sotto della soglia di anomalia pari a 31,587% (calcolo meglio dettagliato nel verbale di gara redatto in data 20.09.2019 e approvato con propria determinazione n. 149 del 23.09.2019), sotto le riserve di legge e nelle more delle verifiche così come previsto dalla normativa vigente, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso d'asta del 28,783% (*ventottovirgolasettecentottantatrepercento*) sull'importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che fissa l'importo di € 223.285,23 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 224.481,89, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 273.867,90;
- di dare atto che il secondo in graduatoria è l'operatore economico iK Costruzioni srl con sede a Baratili San Pietro (OR) in Loc. Sa Mitza SP12 km 3,150 P.IVA 03531210924, che ha offerto il ribasso d'asta del 28,298% (*ventottovirgoladuecentonovantottopercento*);



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

Successivamente con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 199 del 03.12.2019 si è stabilito tra l'altro di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "Opere di miglioramento delle infrastrutture rurali nel territorio dei comuni di Nurachi e Riola Sardo" all'operatore economico Conglomerati Bituminosi srl con sede a Simaxis (OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso d'asta del 28,783% (*ventottovirgolasettecentottantatrepercento*) sull'importo posto a base di gara pari ad € 313.527,99, che fissa l'importo di € 223.285,23 per lavori, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 224.481,89, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 273.867,90.

IL CONTRATTO D'APPALTO

il contratto d'appalto Rep. n. 304/2020 è stato stipulato in data 30/01/2020, col quale i lavori in oggetto sono stati formalmente affidati all'operatore economico Conglomerati Bituminosi srl con sede a Simaxis (OR) – SS 388 km 6,700 P.IVA 00053050951, per l'importo netto complessivo dei lavori pari a € 224.481,89, oltre all'Iva in misura di legge.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti conseguenti il quadro economico, approvato con determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 6 in data 21.01.2020, si è modificato come segue:

a1) Importo lavori a base d'asta	€	313.527,99
a2) Ribasso d'asta (28,783%)	€	- 90.242,76
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.196,66
A) Importo complessivo dei lavori	€	224.481,89
b1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%)	€	10.778,52
b2) IVA sui lavori 22%	€	49.386,01
b3) Contribuzione ANAC	€	225,00
b4) Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (1,28%)	€	4.028,48
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€	64.418,01
TOTALE COSTO INTERVENTO	€	288.899,90
C) Economie di gara e ribassi d'asta	€	111.100,10
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	400.000,00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

In data 03.04.2020 il direttore dei lavori Ing. Giordano Fadda ha proceduto alla consegna degli stessi, come si evince da verbale in pari data e dal quale si deduce che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 18/05/2020.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

PERIZIE SUPPLETIVE:

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario redigere alcuna perizia.

PROROGHE

Durante lo svolgimento dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario operare alcuna sospensione.

STATI AVANZAMENTO LAVORI.

Nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi stati di avanzamento.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Nel corso dell'esecuzione delle opere non sono stati emessi certificati di pagamento.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Le opere realizzate e risultanti dai documenti contabili allegati allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione, sono conformi alle previsioni del progetto.

Le stesse sono state eseguite regolarmente secondo le caratteristiche, prescrizioni e quantità previste, salvo lievi modifiche delle quantità rientranti nella facoltà discrezionale del direttore dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 18/05/2020 nel rispetto del tempo utile previsto.

STATO FINALE DEI LAVORI

In data 26/05/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Giordano Fadda ha redatto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2020, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 224.481,89 per lavori, comprensivi di € 1.196,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

La contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori in oggetto, predisposti dal direttore dei lavori Ing. Giordano Fadda sono stati approvati con la determinazione n. 69 del 08.06.2020. Dagli atti di contabilità si rileva che l'operatore economico affidatario Conglomerati Bituminosi srl ha eseguito opere per complessivi netti € 223.285,23, oltre ad € 1.196,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 224.481,89, per effetto dei quali, dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 0,00, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 224.481,89, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 273.867,91.

II DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 31 comma 12 del Codice dei contratti, in data 03.04.2020 il RUP Ing. Antonio Mastinu ha predisposto il documento di programmazione per il controllo sull'esecuzione dei contratti con il quale sono state individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Mastinu
